WEEKLY ADVANCE Weekly- 1 RO

PROJECT REF NO. PERIODE PROJECT SUBJECT

: MTI MOROWALI SOC230005

: 24 July - 31 July 2023

: Advance Weekly

BUDGET USAGE :

4.023.690.711

PROGRESS : 30,53%

KETERANGAN BUDGET KETERANGAN Item HARI QTY UNIT HARGA (@) SYSTEM & CONSUMABLE OVER HEAD Foto Copy Dokumen & Laporan Provisi Bank 60.000 Kost SM & Eng Kebersihan Kost lot 60.000 Air Minum 350.000 350,000 minggu Parkir malam Mobil DN 1437 NP 300.000 300.000 Periode Juni - Juli bulan Cuci Mobil DN 1437 NP 100.000 -200,000 lot Kasur unit 250.000 1.000.000 untuk MP Bantal 50.000 350:000 unit untuk MP Kipas 300.000 600,000 Mess MP baru unit Colokan listrik unit 70.000 280,000 Mess MP baru ВВМ 210 itr 15.000 3.150.000 3 mobil Mob demob pekerja lot 51.000 51.000 Kirim dokumen ke HO Travel QC & Ware House 400.000 800.000 dari site Labota ke Bandara Morowali Travel MP yang baru lot 1.000.000 2.000.000 Carter mobil dari Bandara Morowali ke Mess Kacamata Safety King 55.000 550.000 untuk MP baru 10 Biaya Tak Terduga lot 500.000

NOTE

Total

Silahkan ditransfer ke rek. : Bank BRI No. REK 768601019106501

A/N REYNALD EDWIN MONSITO, ST

Menyetujui

10.191.000 6.991.000

BUDGET 4.023.690.711 1.220.212.682 REALISASI 30,33% 2.803.478.028.99 SISA BUDGET 69,7% PROGRESS PEKERJAAN 30,53%

kontrak

Actual

12271.12 2005

30,53%

06-Jul-23

OLYTEC COMPOSITES

Mansyur Deputy Directur








Hari ini

🔀 Panggilan suara tak terjawab pukul 10.27

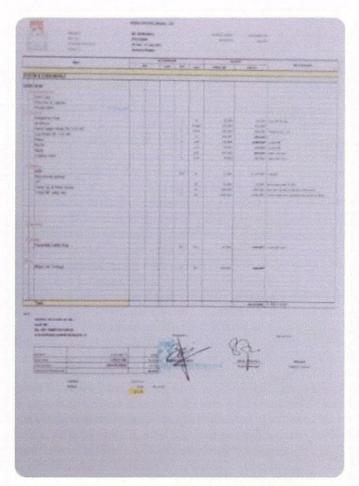

Pak Mansyur, mohon dibantu Approved Adv. Weekly per 24-31 Juli 2023. Project MTI terlampir

ok _{15.51}

Pak bs dibantu screenshot email nya, buat dilampirkan ke pengajuan adv nya







