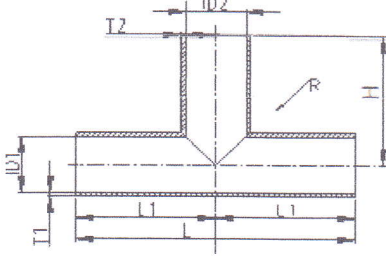
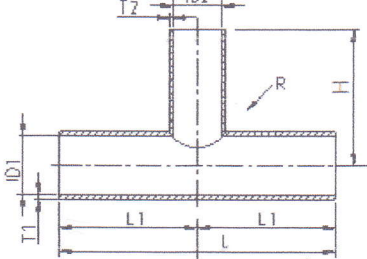


DIMENSIONAL & VISUAL INSPECTION TEE EQUAL / TEE REDUCER



Doc. No : FM-C3.2-25 / Rev. No. : 4 / Issue Date : Jan 23th, 2018

Customer : RAPP
 Project : FIBER LINE 3B / PIPE BRIDGE
 Type of Fitting : DN 800 EQUAL TEE
AG / PN 10

Dwg No. : FL3B-186 P-7001-006

Tee Equal	Tee Reducer	Resin Batch No.
		-
		Hardener Batch No.
		-
		WR Batch No
		-
		C Veil Batch No.
		-
		CSM Batch No.
		-

Insp Point	Standard	Tolerance	Daycode						
			AR 199 FL-001	AR 199 FL-002	XX				
ID 1	800		800	800					
T1	15	±12.5%	15.2	15.5					
ID 2	800		800	800					
T2	15	±12.5%	15.9	15.4					
L	1600	±6.0	1606	1606					
L1	800	±6.0	803	803					
H	800	±6.0	805	806					
Rad									
Roundness			OK	OK					
Barcol			34	34					
Visual Before Coating			OK	OK					
Visual After Coating			OK	OK					
Result			Pass	Pass					
Date of Inspection			25-07-22	25-07-22					

Insp Point	Standard	Tolerance	Daycode						
ID 1									
T1									
ID 2									
T2									
L									
L1									
H									
Rad									
Roundness									
Barcol									
Visual Before Coating									
Visual After Coating									
Result									
Date of Inspection									
			Prepared	Checked	Approved				
			 Inspector	 Supervisor					
					Dept. Head				
